

港区立御田小学校改築工事スケジュール及び新校舎運用開始時期の変更について

○工事スケジュールの変更について

不調理由により工期を大きく見直す必要があることから、令和6年第1回港区議会定例会に当初予算案を提出し、工期の延長に伴う工事費等の予算額を増額し令和10年度までの債務負担を設定した上で再度入札を行います。第2回港区議会定例会に工事議案上程後、令和6年7月着工、令和10年11月の工事完了に変更します。


【変更前】令和6年4月から令和9年2月まで（工事期間 35か月）

【変更後】令和6年7月から令和10年11月まで（工事期間 53か月）

○御田小学校新校舎の運用開始時期の変更について

御田小学校新校舎の運用開始時期は工事スケジュールの変更に伴い、令和11年1月（3学期）からの運用開始予定とします。

変更後				現在			
着	工	令和6年	7月	着	工	令和6年	4月
竣	工	令和10年	11月	竣	工	令和9年	2月
運用開始		令和11年	1月	運用開始		令和9年	4月

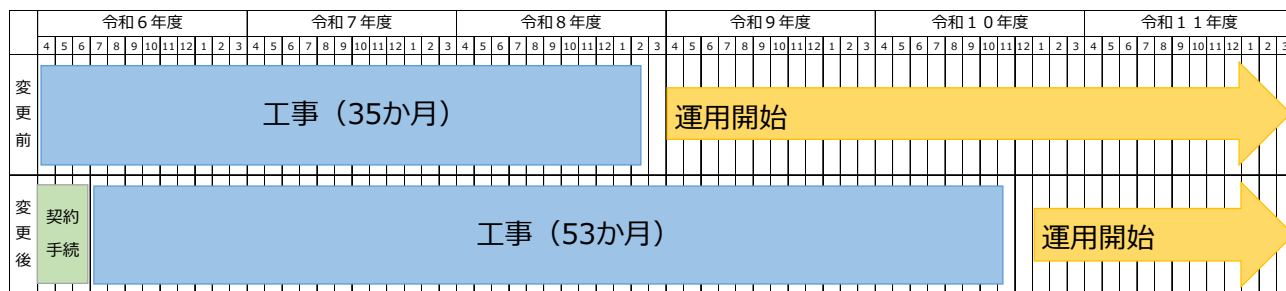

また、令和6年4月から改築期間中の仮校舎として使用する旧三光小学校（港区白金三丁目18番2号）については、令和9年3月までの使用予定でしたが、新校舎運用開始時期の変更に伴い令和10年12月までの使用に延長し、仮校舎で令和6年4月から運用を開始する「放課GO→クラブみた」についても同様とします。
